



@Risk Output – Detailed Statistic

Output dari aplikasi @Risk mengenai durasi proyek terhadap jadwal *baseline* tanpa penundaan pada aktivitas nonkritis manapun

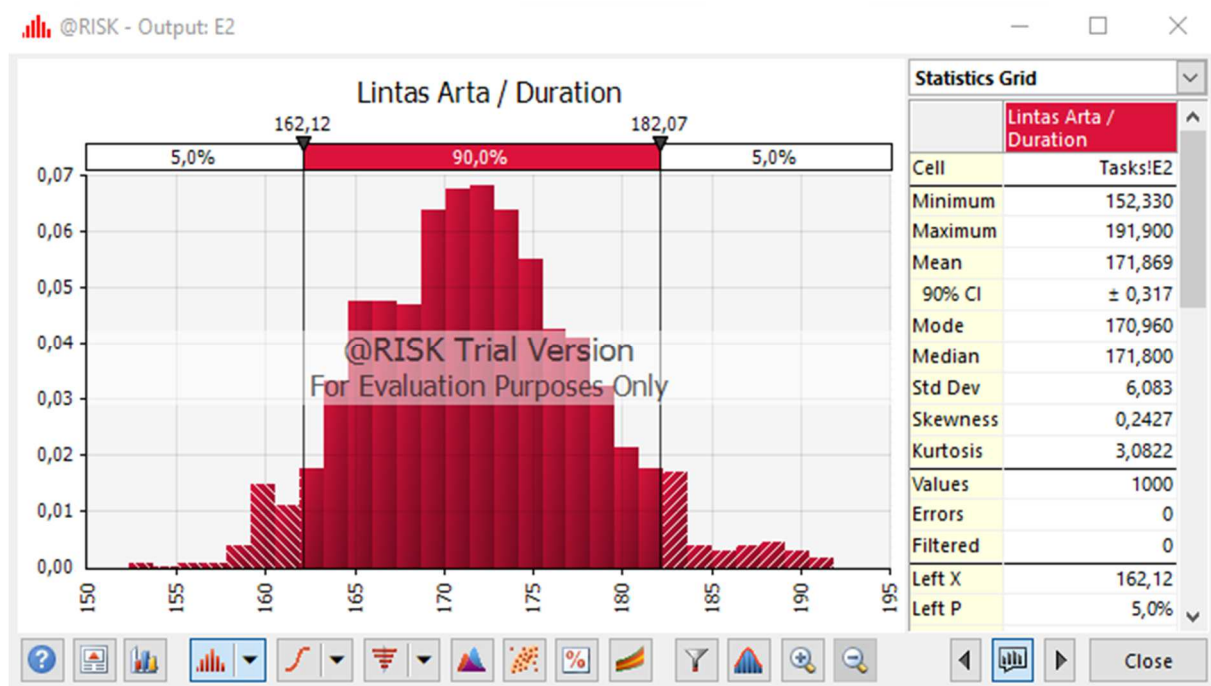

Output dari aplikasi @Risk mengenai biaya proyek terhadap jadwal *baseline* tanpa penundaan pada aktivitas nonkritis manapun

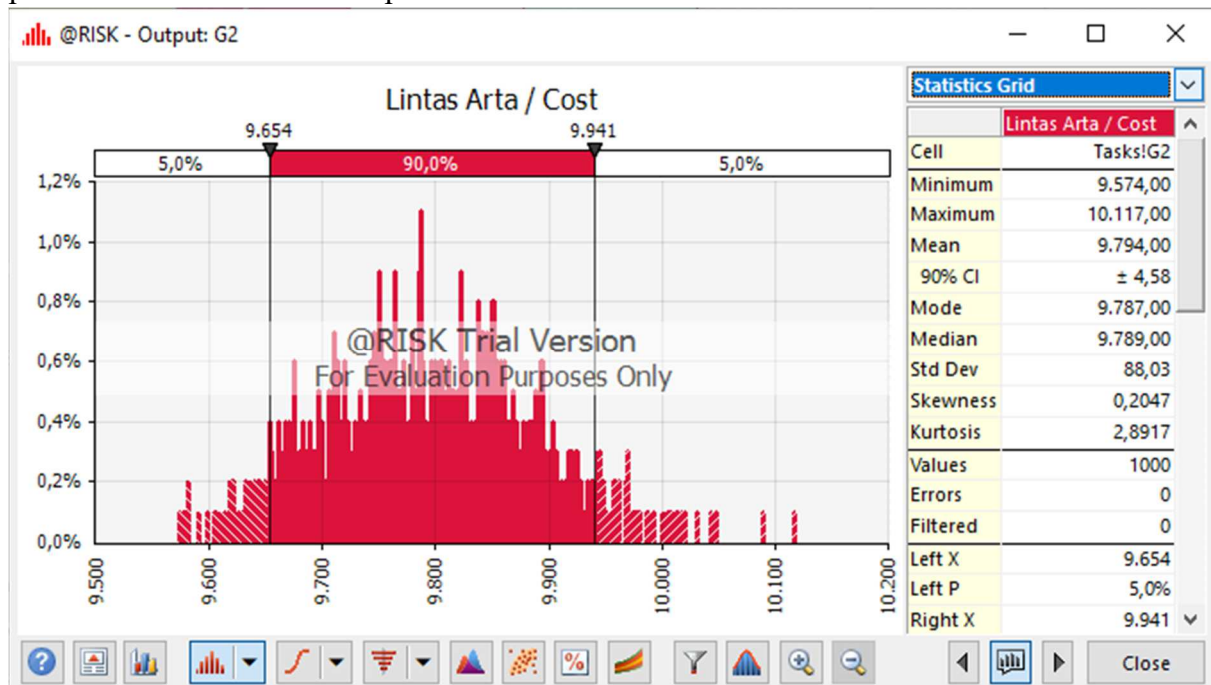

@Risk Output – Detailed Statistic

Rekapitulasi *detailed statistic* durasi proyek

Uraian	Detailed Statistic (Durasi Proyek)										
	Penggunaan <i>Float</i> Pada Aktivitas 9										
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Minimum</i>	152,33	153,67	155,35	156,06	155,80	158,01	158,03	156,97	157,74	157,93	155,05
<i>Maximum</i>	191,90	195,16	191,32	196,70	196,13	198,72	197,15	199,05	198,55	197,38	205,42
<i>Mean</i>	171,87	172,39	172,39	172,60	172,89	173,47	173,89	174,19	174,90	175,46	176,19
<i>Std Dev.</i>	6,08	6,09	6,13	6,26	6,41	6,35	6,46	6,55	6,66	6,75	7,16
<i>Variance</i>	37,00	37,05	37,52	39,15	41,06	40,30	41,73	42,90	44,41	45,60	51,26
<i>Skewness</i>	0,24	0,22	0,22	0,32	0,28	0,39	0,48	0,41	0,44	0,43	0,46
<i>Kurtosis</i>	3,08	3,09	2,87	3,08	3,12	3,45	3,12	3,25	3,17	3,07	3,26
<i>Errors</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Mode</i>	170,96	175,02	173,09	168,66	170,97	172,07	169,14	166,45	168,63	170,64	171,67
<i>5% Perc</i>	162,12	162,92	162,69	162,78	162,49	163,25	164,11	164,40	164,83	165,47	165,50
<i>10% Perc</i>	164,30	164,78	164,77	164,86	164,86	165,53	165,66	166,27	166,62	167,18	167,31
<i>15% Perc</i>	165,47	166,04	165,84	166,04	166,35	167,00	167,27	167,44	168,22	168,61	168,91
<i>20% Perc</i>	166,50	167,10	167,14	167,26	167,37	168,10	168,29	168,58	169,14	169,62	170,39
<i>25% Perc</i>	167,53	168,18	168,10	168,32	168,43	169,24	169,17	169,77	170,26	170,59	171,10
<i>30% Perc</i>	168,59	168,83	169,02	169,10	169,21	170,02	170,02	170,59	170,99	171,39	172,22
<i>35% Perc</i>	169,34	169,69	169,71	169,83	169,97	170,97	170,91	171,38	171,99	172,47	173,11
<i>40% Perc</i>	170,25	170,69	170,69	170,64	170,97	171,75	171,82	172,22	172,82	173,34	174,02
<i>45% Perc</i>	171,09	171,32	171,44	171,53	171,87	172,46	172,65	172,85	173,54	174,03	174,79
<i>50% Perc</i>	171,80	172,02	172,22	172,09	172,68	173,20	173,39	173,54	174,33	174,95	175,58
<i>55% Perc</i>	172,33	172,92	172,88	173,06	173,58	174,05	174,19	174,43	175,14	175,75	176,26
<i>60% Perc</i>	173,19	173,74	173,67	173,88	174,64	174,80	175,09	175,49	176,12	176,56	177,09
<i>65% Perc</i>	173,88	174,63	174,49	174,70	175,30	175,42	176,09	176,33	176,92	177,37	178,25
<i>70% Perc</i>	174,83	175,52	175,35	175,63	176,08	176,33	177,08	177,03	178,02	178,69	179,33
<i>75% Perc</i>	175,69	176,56	176,37	176,81	176,81	177,34	177,96	178,28	178,98	179,87	180,70
<i>80% Perc</i>	176,94	177,50	177,46	177,86	178,12	178,35	178,85	179,70	180,25	181,07	182,00
<i>85% Perc</i>	178,14	178,66	178,75	179,05	179,30	179,56	180,32	180,83	181,71	182,40	183,36
<i>90% Perc</i>	179,81	180,33	180,76	180,65	181,00	181,19	182,30	182,72	184,09	184,53	186,09
<i>95% Perc</i>	182,07	182,59	182,80	183,08	183,60	184,89	185,73	185,82	186,43	187,11	189,18

Hubungan penggunaan *float* pada aktivitas 9 terhadap total durasi proyek rata-rata

